

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 22 de octubre de 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LA CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓
 LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3632 HABITANTES FONDO FAISMUN 2025 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LUIS MIGUEL DURAN COLIN ✓ N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.254. AD.2025 ✓
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 800,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 794,839.08 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 794,839.08 ✓
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22-sep-25 ✓ FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 20-nov-25 ✓ FECHA DE TERMINO REAL: 21-oct-25 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1 PRELIMINARES			
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1324.42
1.02	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION KM SUBSECUENTES SEGÚN PROYECTO (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	0
1.05	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1357.5
2 TERRACERIAS			
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	203.65
3 REVESTIMIENTO			
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	584.01
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	774.98
3.03	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALCO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	34.35
4 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
4.01	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5
4.02	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 M. CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.		

OPERADO

2025




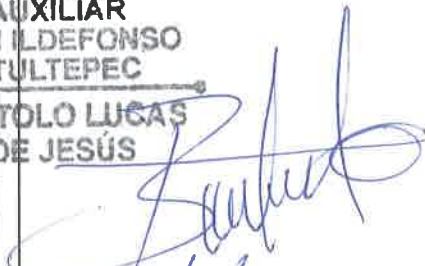


RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO		AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADO AUXILIAR SAN ILDEFONSO TULTEPEC BARTOLO LUCAS DE JESÚS
 Luis M. Querañ C. NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	 ING. LUIS UGALDE RIOS NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR		
 Jose Querañ NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	 ING. JUAN MANILE COLIN MORALES NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA		 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO
2025
RAMO 33
FAISMUN
