



GOBIERNO MUNICIPAL



321

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 2019

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINO EN LA NORIA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL."

PROGRAMA: FAFE-2019

LOCALIDAD: EL LINDERO BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-017/2019 INICIO: 03-JUNIO-2019 TERMINACIÓN: 31-AGOSTO-2019

No. DE HABITANTES: 894.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 520,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 894.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 520,000.00

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 2,135.00 M2.
COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA, EN 2,125.45 M2.
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACION DEL ACERO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 1.226 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO EN 103.04 M3.
FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 424.76 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO EN 1,820.40 M2.
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 45.495 M3.

OBRAS DE DRENAJE:

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 1.00 M2 DE AREA HIDRAULICA, 7.40 M DE LONGITUD 01 PZA.

Handwritten signature in blue ink.




GOBIERNO MUNICIPAL



OBRAS COMPLEMENTARIAS:

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 EN 06 ML.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,767.414 M2. COLOCACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

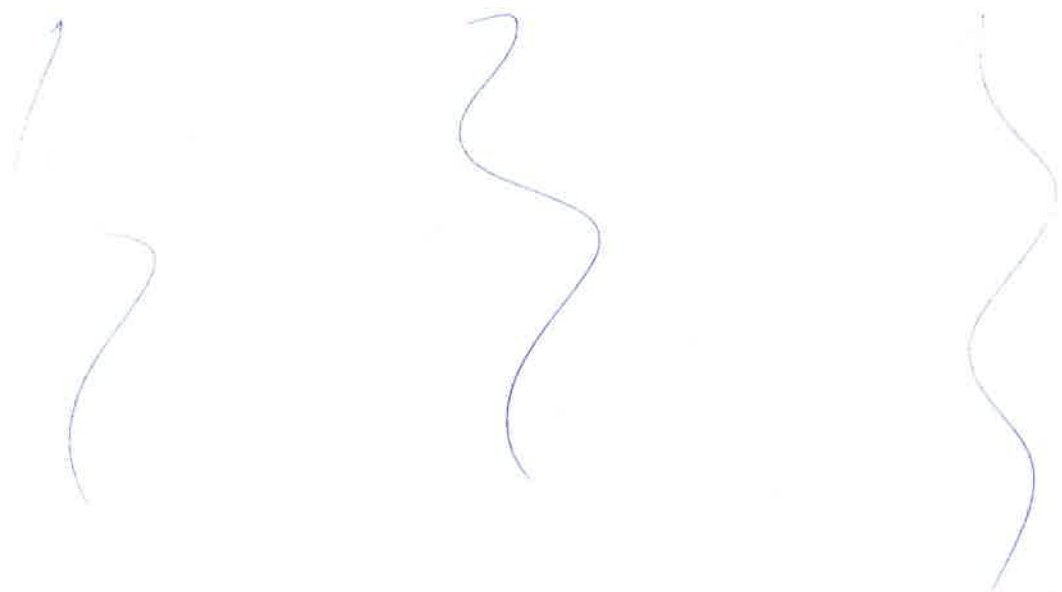

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cerunites
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALORÍA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Ma Guadalupe Serrano Bolanos
NOMBRE FIRMA Y SELLO
Subdelegado Auxiliar
EL LINDERO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Eloy GF
Eloy Gorbano Florantino
NOMBRE Y FIRMA

Carolina Rivera
NOMBRE Y FIRMA

Ilación Pezúña T.
NOMBRE Y FIRMA
