

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 MUNICIPIO - COMUNIDAD



DATOS DE LA OBRA

FECHA: martes, 28 de noviembre de 2023

NOMBRE DE LA OBRA: **IMPULSO QUERETARO SANTANDER 2023 - EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN AVENIDA LA FUENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **180 HABITANTES**

FONDO: **FAFEP 2023**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. MARTIN ROCHA VAZQUEZ**

N° DE CONTRATO: **MAQ.338.IQS.23**

INVERSIÓN APROBADA: \$ **500,000.00**

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ **495,836.68**

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **495,836.68**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **18-oct-23**

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: **10-dic-23**

FECHA DE TÉRMINO REAL: **28-nov-23**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1. PRELIMINARES.</b>			
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	840.66
1.02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	50.00
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	65.00
<b>2. TERRACERIAS</b>			
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	140.00
<b>3. REVESTIMIENTO</b>			
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA, DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO Fc = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	700.00
3.02	DENTELLON DE 15 X 30 DE SECCION DE CONCRETO Fc = 200 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00
3.03	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.30 MTS DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACION, COMPENSACION, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	140.00
3.04	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	12.94
<b>4. OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>			
4.01	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE HASTA 60 CM DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIONES A MANO, DESMONTAJE DE TAPA Y BROCAL SIN RECUPERACION, RECONSTRUCCION DE MURO DE DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
4.02	TOPE TRAPEZOIDAL DE TRANSITO VEHICULAR DE 0.40 - 0.60 - 0.40 MTS DE DESARROLLO Y UNA ALTURA AL CENTRO DE 0.08 MTS. ELABORADO CON UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO Fc = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. PARA EL FORJADO DEL TOPE, SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE)	ML	5.00
4.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	839.80
4.04	ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO II, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISION, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACION A MANO, CONCRETO Fc=200KG/CM2 CON SECCION DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
POR EL MUNICIPIO
ING. ARG. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA N.
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA


POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
Pedro concepcion Melita
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Pedro concepcion Melita
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
Fraida Sixto cestia pascual
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
Fernando silvestre
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
Martin Dominguez
AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
MARTIN DOMINGUEZ
FELIPE
SU DELEGADO AUXILIAR
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
MEXQUITTLAN

Liliana Atilana Herretero
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
Daniel Macario Cresencia
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

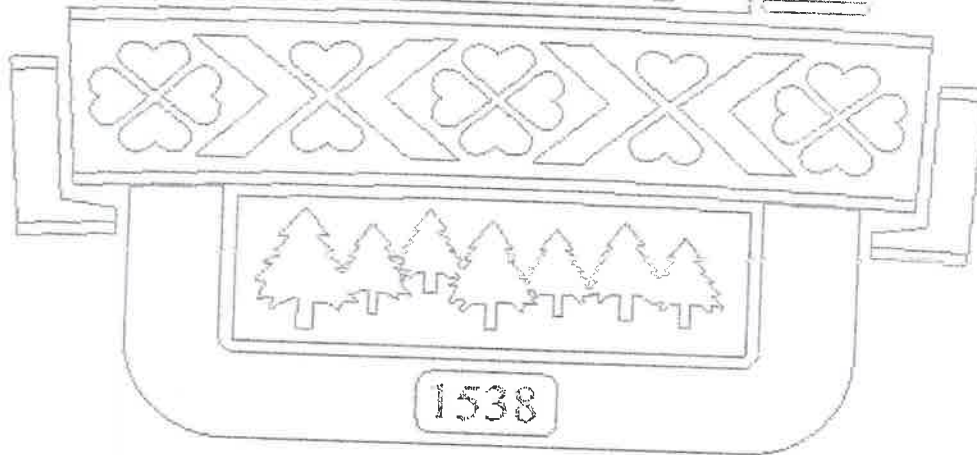

1538
