

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: viernes, 11 de agosto de 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FISE 2023 – AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO), AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 48

FONDO: FISE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. GERARDO BARBOSA CORREA

N° DE CONTRATO: MAQ.297.FISE.23

INVERSIÓN APROBADA: \$ 620,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 613,799.92 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 613,799.92

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 13-jun-23

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 11-ago-23

FECHA DE TÉRMINO REAL: 11-ago-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 12" (304 MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMÉRICO MÉRCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	357.90
1.02	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15.00 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, MANIOBRAS DE CARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
2	OBRA CIVIL		
2.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN EN URBANIZACIÓN.	M2	323.28
2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M DE DISTANCIA, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	266.05
2.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	345.86
2.04	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.S.M (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	37.26
2.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO CON COPILE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	357.90
2.06	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	146.17
2.07	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	84.27
2.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA DE 15 CMS DE ANCHO, PARA ADVERTENCIA EN TUBERÍA EN ZANJA, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	366.00

OPERADO
RAMO DE FISE

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO. SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa"

Este programa es de carácter público no es patrocinado y promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro o por distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser removido de su cargo de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. NO NEGOCIABLE

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

2.09	ENCOFRADO DE TUBERIA DE CUALQUIER DIAMETRO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO. INCLUYE: EXTENDIDO, COLADO, CURADO, VIBRADO, ACABADO SEGUN ESPECIFICACIONES, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	26.90
3	POZOS DE VISITA		
3.01	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD INC: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R. R. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA).	PZA	8.00
3.02	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INC : PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R. R. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA).	PZA	1.00
3.03	BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE 34-KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TON., INC : MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PARA ASENTAR SOBRE MURO DE POZO, ANILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 30 CM X 20 CM, REFORZADO CON VARILLAS DE NO. 4 EN AMBOS SENTIDOS, INC : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	9.00
4	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
4.01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIA NECESARIAS, INCLUYE: EL EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTACAS, MOJONERAS, BANOS DE NIVEL, HERRAMIENTA, CALHIDRA, HILAZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	21.30
4.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00' A 2.50M. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M DE DISTANCIA, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	20.46
4.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRAGERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	26.60
4.04	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	2.24
4.05	SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD CORRUGADA TDR-ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 6" (150MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	21.30
4.06	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO ULTRA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6" DE DIÁMETRO CON COPLER Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	21.30
4.07	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	4.42
4.08	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	6.39

"Esta obra no se realiza con recursos públicos locales"

OPERADO
RAMO 33 FISE

2023

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa"

Este programa es de carácter público no es patrocinado y promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro o por distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. **NO NEGOCIABLE**

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO Y PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.09	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA CORRUGADA LA CUAL ES DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, UNA TEE DE 12"x6" PARA TUBERÍA CORRUGADA, LUBRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
4.10	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR INC: EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZON DE LA PROPORCION 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE ; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	9.00
5.02	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO PROPORCIÓN 1.5 LTS/M2, CON EQUIPO. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, BOMBEO Y APLICACIÓN DEL RIEGO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	9.00
5.03	RENIVELACIÓN DE 2.5 CM DE ESPESOR DE ARROYO DE VEHICULAR MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20, TENDIDO CON MOTO CONFORMADORA, COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.S.M. ACARREO DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE CARPETA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
5.04	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-65, APLICADA A RAZÓN DE 0.60 L/M2 CON PETROLIZADORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
5.05	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR CON AGREGADO DE 3/4" A FINOS Y AC-20, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.00
5.06	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.58
5.07	ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO I, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 106CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 28 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN; BASTIDOR INTERMÉDIO HORIZONTAL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00
5.08	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2". PARA 10 MT'S DE LONG PROMEDIO. INC : MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00

OPERADO
RAMO 33 FISE

2023

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

Este programa es de carácter público no es patrocinado
y promovido por partido político alguno y sus recursos
proviene de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa
con fines políticos, electorales de lucro o
por distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la Ley aplicable y ante la
autoridad competente. NO NEGOCIABLE

"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>  <p>C. GERARDO BARBOSA CORREA</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>  <p>ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO</p>	 <p>AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DELEGACIÓN SANTIAGO MEXQUITITLÁN DELEGADO</p>  <p>Joaquin Santillan Salazar NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</p>
<p>RESIDENTE</p>  <p>ING. JOSE LUIS MEJIA MONTOYA</p>	<p>SUPERVISOR</p>  <p>ING. ARQ. ALEJANDRO GUTIERREZ GARCÍA</p>	

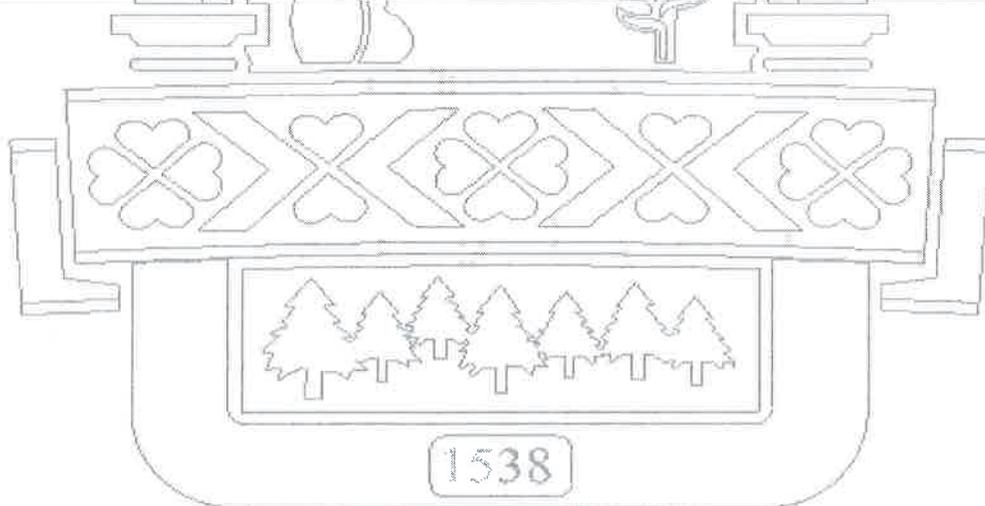

OPERADO
RAMOS FISE
2023

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

Este programa es de carácter público no es patrocinado
y promovido por partido político alguno y sus recursos
proviene de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa
con fines políticos, electorales de lucro o
por distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la Ley aplicable y ante la
autoridad competente. NO NEGOCIABLE

**"Esta obra fué realizada con
recursos públicos federales"**
