

2026

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



**AMEALCO DE BONFIL**  
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA 20 DE JULIO DEL 2026

| DATOS DE LA OBRA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA                   | FAISMUN 2026 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |
| LOCALIDAD                           | GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                        |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS:             | 710 HABITANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FONDO FAISMUN 2026 ✓                               | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO       |
| DATOS DEL CONTRATO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                        |
| CONTRATISTA                         | ISMAEL PIÑA MIRANDA ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Nº DE CONTRATO MAQ.328.FAISMUN.AD.2026 |
| INVERSIÓN APROBADA                  | \$ 700,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INVERSIÓN CONTRATADA \$ 693,100.86 ✓               | INVERSIÓN EJERCIDA \$ 693,100.86 ✓     |
| FECHA DE INICIO DE CONTRATO         | 24 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO 22 DE AGOSTO DEL 2026 | FECHA DE TÉRMINO REAL 17-jul-26 ✓      |
| DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                        |
| Nº                                  | COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD                                             | CANTIDAD                               |
| <b>1</b>                            | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                        |
| 1.01                                | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS TOPOGRÁFICAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2                                                 | 1,194.36                               |
| 1.02                                | EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: TRASPALEOS HORIZONTAL A 20 M, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3                                                 | 169.90                                 |
| 1.03                                | ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3                                                 | 169.90                                 |
| 1.04                                | ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3/KM                                              | 169.90                                 |
| <b>2</b>                            | <b>TERRACERIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        |
| 2.01                                | RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2                                                 | 0.00                                   |
| 2.02                                | FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                              | M3                                                 | 178.62                                 |
| <b>3</b>                            | <b>REVESTIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |
| 3.01                                | REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON MORTERO HIDRÁULICO PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN DE 0.05 M3 DE PIEDRA Y 0.10 M3 DE MORTERO F/C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE LA SUPERFICIE, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2                                                 | 472.94                                 |
| 3.02                                | REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON TEPETATE PARA ASENTAR Y JUNTEAR, CON PIEDRA BOLA A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA Y 0.067 M3 DE TEPETATE DE BANCO: COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 10-12 TON, FORJADO EN FRANJAS DE 1.00 M DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                       | M2                                                 | 522.00                                 |



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2014 - 2027

| 4    | OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 4.01 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES, CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3    | 0.00  |
| 4.02 | ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3    | 0.00  |
| 4.03 | ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3/KM | 0.00  |
| 4.04 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 M DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIO DE CABALLETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3    | 0.00  |
| 4.05 | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR PARA ALCANTARILLA PLUVIAL, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADA CON UNA PARRILLA DE ACERO DE VARILLAS CORRUGADAS DEL N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA EN LECHO SUPERIOR, CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, COMPACTADO, SILLETAS, CHAFLAN EN ARISTA TRANSVERSAL INFERIOR, FRONTERAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACIÓN Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2    | 0.00  |
| 4.06 | TRABE DE CABEZOTE DE SECCIÓN 20 x 40 CM DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 kg/cm2 (SECCIÓN DE COLADO DE CONCRETO DE 20x20 CM) HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CLAFLANES EN TODAS LAS ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                             | ML    | 0.00  |
| 5    | OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| 5.01 | ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO CON MATERIAL TEPETATE SIN COMPACTAR, SECCIÓN TRANSVERSAL DE 50 CM DE ANCHO EN LECHO SUPERIOR Y 15 CM DE ESPESOR, PROVISTO DE UN TALUD DE PATEO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS. INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3    | 29.25 |
| 5.02 | DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML    | 17.50 |
| 5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.62, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MÍNIMO, CON CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.                                                                                                                                                                    | PZA   | 1.00  |



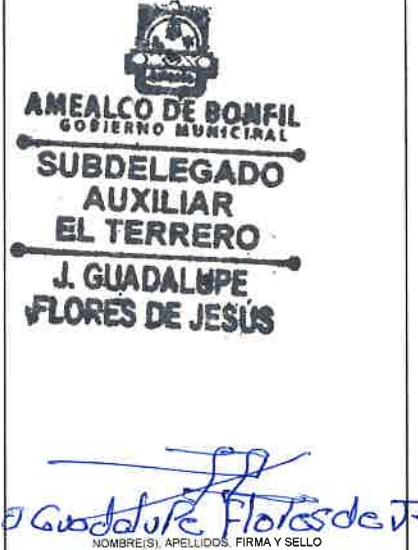
2026

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



**AMEALCO DE BONFIL**  
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

| ENTREGA                                                                                                             | RECIBE POR EL MUNICIPIO                                                                                         | AUTORIDAD LOCAL                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| EJECUTOR Y/O CONTRATISTA                                                                                            | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO                                                                  |                                                                                                                             |
| <br>ISMAEL PIÑA MIRANDA            | <br>ING. LUIS UGALDE RIOS      | <br>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO |
| RESIDENTE                                                                                                           | SUPERVISOR                                                                                                      |                                                                                                                             |
| <br>ARQ. MISAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | <br>ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO |                                                                                                                             |

