

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FORTAMUN 2023-REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS UBICADOS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: AMEALCO CENTRO

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7953 HABITANTES FONDO: FORTAMUN 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ N° DE CONTRATO: MAQ.319.FORTAMUN.23

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 991,052.91 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 991,052.91

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 05 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 30-nov-23 FECHA DE TERMINO REAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON HILO MANGUERA Y NIVEL DE MANO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS. CON PUENTES DE MADERA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	78.00
1.02	RETIRO DE MAMPARAS DE HERRERÍA DE HASTA UNA ALTURA DE 1.80 M. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO AL LUGAR DONDE DESIGNE LA SUPERVISIÓN.	M2	35.93
1.03	RETIRO DE ESPEJO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA, ACARREO A 20 MTS FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.04	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE WC, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A LUGAR DONDE DESIGNE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.05	RETIRO SIN RECUPERACION DE LAVABO, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A LUGAR DONDE DESIGNE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A LUGAR DONDE DESIGNE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.28
1.07	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A LUGAR DONDE DESIGNE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.08	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A LUGAR DONDE DESIGNE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.09	RETIRO DE AZULEJO EN PARED, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A 20 MTS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.00
1.1	RETIRO DE LOSETA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A 20 MTS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	40.98
1.11	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUÉLTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.51
1.12	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	1.51
2	ALBAÑILERÍA		
2.01	APLANADO CON ESTUCO EN PLAFÓN Y MUROS, ACABO ESPONJA, A REVENTÓN DE 8 MM DE ESPESOR, HASTA 4.00 MT DE ALTURA. INCLUYE: REBABEO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 1 MANO DE SELLADOR VINÍLICO, 2 CAPAS DE PLASTE DE ESTUCO, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	197.03
2.02	LOSA DE 8.00 CM CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8 @20CM EN SENTIDO TRANSVERSAL Y LONGITUDINA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TERMINADO PULIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.53

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.


2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE LAVABO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLISS RECTIFICADO SATIN WHITE 30 X 60 ACABADO SATINADO, PEGADO A HUESO CON PEGAZULEJO MARCA FORTEC, Y JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.50
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO CUERPO INTERCERAMIC MATE EN FORMATO GRANDE 60X60 CMS, ESTILO MÁRMOL, COLOR NEGRO, PEGADO EN BARDAS A HUESO CON PEGAZULEJO MARCA FORTEC, Y JUNTAS CON CEMENTO BLANCO-COLOR, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	167.81
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC EN FORMATO EXTRA GRANDE 60X120 CMS PEGADO PISO EN BARDAS A HUESO CON PEGAZULEJO MARCA FORTEC, Y JUNTAS CON CEMENTO BLANCO-COLOR, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	78.00
2.06	PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	204.92

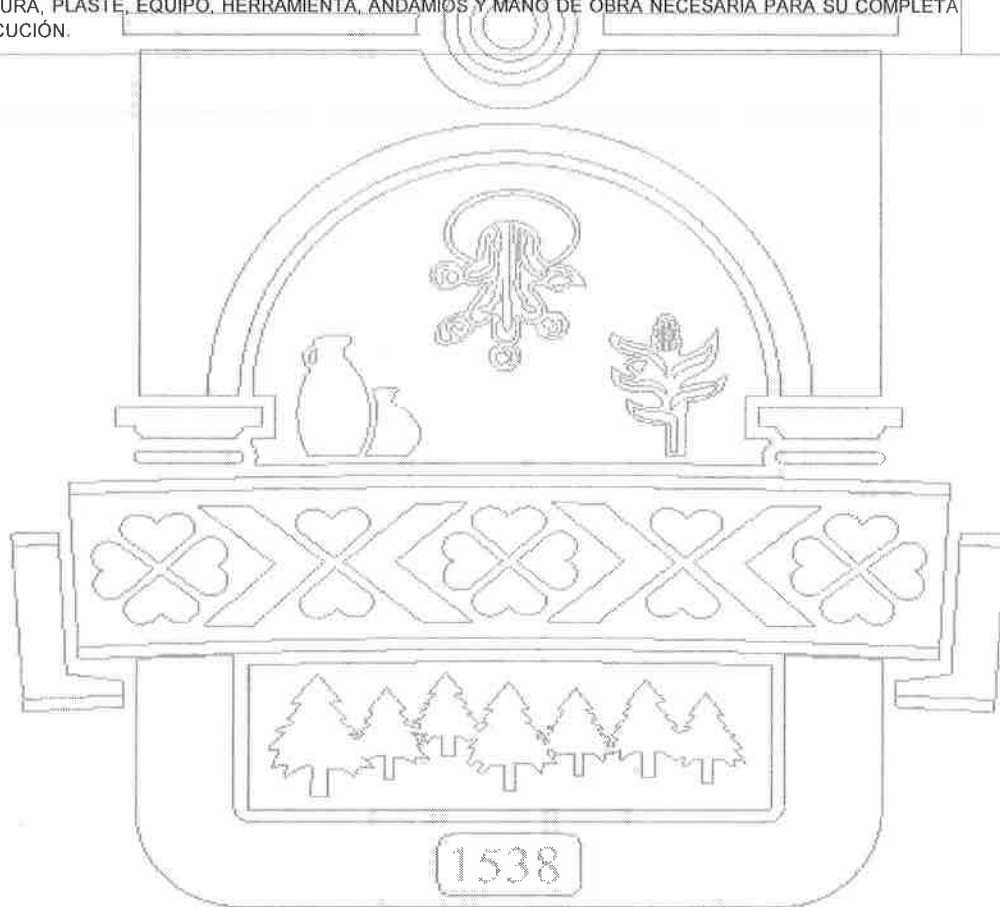

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

3	MUEBLES		
3.01	SALIDA HIDRÁULICA PARA WC CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 13 MM Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 2 M. INCLUYE: 1 TEE DE 1" DE TUBOPLUS, 1 REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 3/4 A 1/2", 1 CODO DE 90°X1/2" DE TUBOPLUS, 1 CONECTO MACHO ROSCABLE DE 1/2" DE TUBOPLUS, CORTES, RANURAS, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	12.00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AMERICAN STANDARD OLIMPICO FLOWISE 4000101/3075000020 CON ASIENTO 2 PIEZAS BLANCO, INCLUYE LLAVE ANGUAR DE 1/2", MANGUERA FEXIBLE, BRIDA CON GUIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.	PZA	12.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER LINEA MILAN MARCA INTERSERAMIC COLOR BLANCO DE 440X440 MM, INCLUYE MONOMANDO MARCA HELVEX MODELO E-907 ACABADO CROMO, DOS LLAVES ANGULARES, DOS MAGUERAS FLEXIBLES, CESPOL DE ACORDEON, Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA SAHARA. ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, COLOR BLANCO. INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTES, PRUEBAS DE SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ACARREO, SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETE EJECUCIÓN	PZA	3.00
3.05	MAMPARA SANITARIA TIPO COSMOPOLITA (PB-100), FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24, MARCO INTERIOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO DE 1", RELLENO DE HONEY COMB. PERIMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 24 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD EN PANELES DE 1.50 Ó 1.80M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MAMPARAS, PANELES LATERALES, ESQUINEROS CANAL, PILASTRAS A PARED, AJUSTES, EXPANSORES ACABADO GALVANIZADO, BIRLOS DE 3/8" X 4" Y	M2	36.60
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN COLOR BLANCO AC70000 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	4.00
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA URREA MODELO 35.3501.23 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	12.00
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 0.70 DE ANCHO Y HASTA 2.20 M DE ALTO, INCLUYE PUERTA DE TAMBOR, MARCO DE MADERA DE 14 CM DE ANCHO, TOPE DE MADERA DE 2CM, BISAGRAS, POMO MARCA PHILLIPS ACERO INOXIDABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CIRCULAR DE 50 CM DE DIÁMETRO BISELADO, INCLUYE COLOCACIÓN A DOS CENTÍMETROS DE SEPARADO DE LA PARED, TAQUETES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMBIADO DE PAÑAL HORIZONTAL MARCA KOALA KARE BEAR MODELO KB300-05, INCLUYE TORNILLERÍA PARA SUJECIÓN, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NEGRO DE 2" CON VIDRIO MARTELINADO DE 1.40 M POR 1.70 M, INCLUYE COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
3.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR DE MANOS MARCA HELVEX MODELO MB-1012-AI ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
3.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOLADERA DECORATIVA MARCA HELVEX MODELO 24-RHLI-60 DE 60CM DE LONGITUD, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
4	INSTALACION ELECTRICA		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO INCLUYE, CHALUPA GALVANIZADA, CONTBP06-M/A PLACA METÁLICA CON CONTACTO DÚPLEX ANODIZADO MARCA LUCEK, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
4.02	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, BP03-M/A PLACA METÁLICA CON 1 INTERRUPTORES SENCILLO DE 1 MÓDULO, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	4.00
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA COLGANTE DE METAL 1.35 M DE ALTURA, POTENCIA MÁX. 1,080 W, 18 BASES MARCA TECNOLITE MODELO CELAENO II, INCLUYE: CONEXIÓN, FIJACIÓN, FOCO TRIANGULAR VINTAGE LED 3.5 W, LUZ SUAVE CÁLIDA MODELO 3DAXLEDFC20VA BASE E27 ATENUABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE, 4.5W LUZ SUAVE CALIDA, LED INTEGRADO, MODELO BEAUVAIS YDLED-800/30, INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

8	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
8.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	78.00
8.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA.	PZA	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA	RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL		AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

1538
